

SMART BUILDING URUGUAY

Locales comerciales Avda. Pedragosa Sierra


Propuesta de proyecto, gestión y obra llave en mano para Juan Carlos García

Padrón 10596 · Punta del Este · mié, 18 nov. 2026

El proyecto

- **4 locales de 62,5 m²** en una planta de 25 × 10 m, para alquilar uno por uno.
- Vidriera continua a la plaza peatonal, faja para cartelería, brise de madera y cenefa negra, como el render.
- Pórticos cada 5 m y luz libre de 10 m: sin columnas adentro, los locales se pueden **unir o dividir** después sin tocar la estructura.
- Se entregan **equipados**: baño accesible, kitchenette, tablero propio, iluminación LED, preinstalación de aire y cartel.
- Medidor de UTE y de agua **independientes por local**: cada inquilino paga lo suyo.
- 6 estacionamientos sobre la avenida y patio de servicio al fondo.

Planta · 4 locales
ejes cada 5 m · luz libre 10 m · cotas parciales y acumuladas desde el eje 1

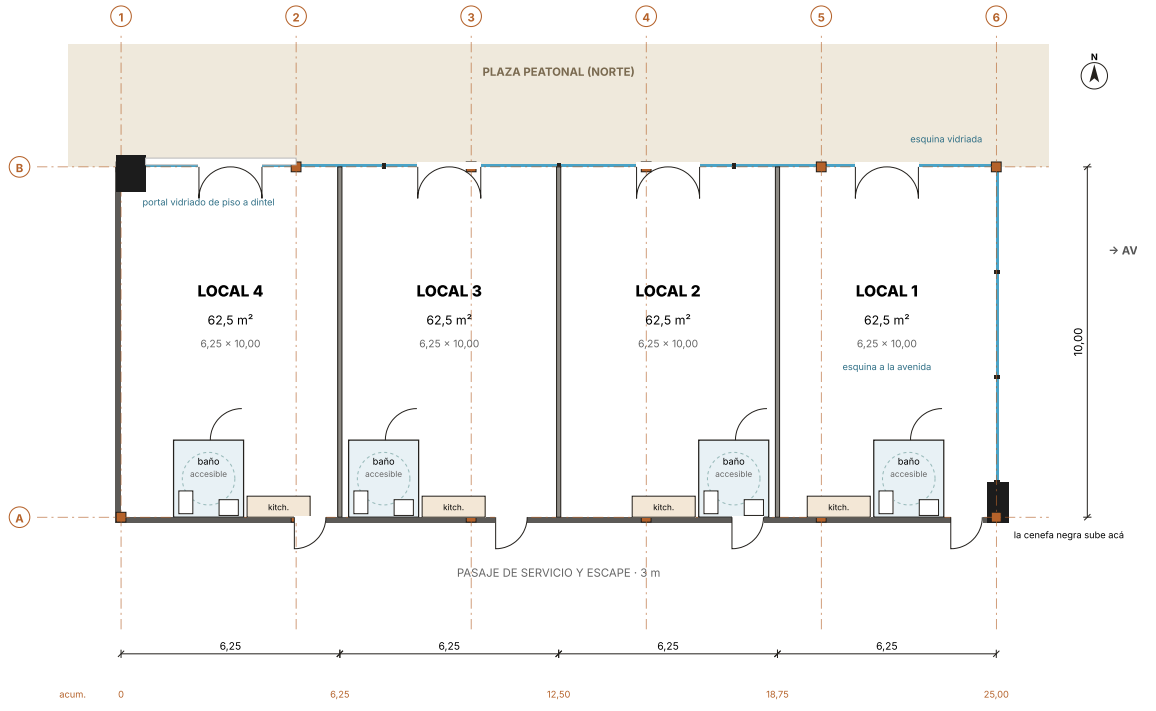

Llave en mano: un solo responsable

Arquitecta del cliente

Anteproyecto

Arq. Pablo Alcoba

Proyecto ejecutivo, planos de sanitaria y eléctrica, permiso con inicio anticipado y trámites en la Intendencia, OSE y UTE

Ingeniero civil

Cálculo de estructura y fundación, planos y firma, control en obra


SBU

Dirección y ejecución de la obra, compras, subcontratos, seguridad, habilitación de Bomberos y entrega

Por qué estructura metálica y paneles

- **Rápido:** el taller fabrica la estructura mientras se hace la fundación, y los paneles cierran el edificio en semanas.
- **Preciso:** todo viene medido de fábrica; en la obra se monta, no se improvisa.
- **Flexible:** sin columnas interiores, los locales se adaptan a cada inquilino.
- **Aislado:** techo de panel PIR y muros de panel, buen confort con menos consumo de aire.

Cronograma: se empieza este año, se entrega en abril

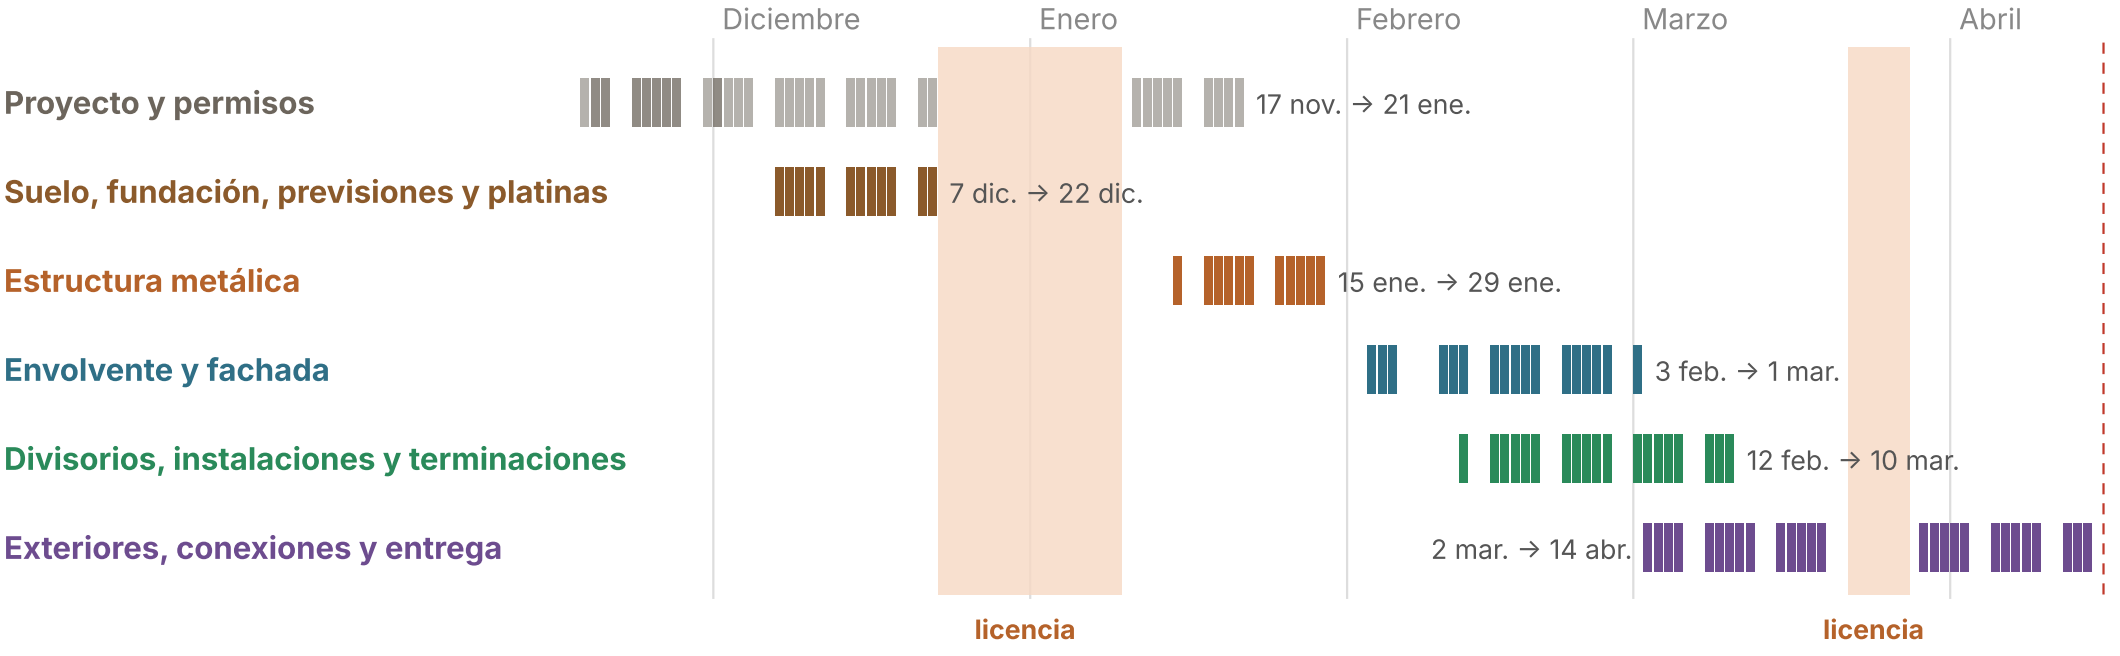

7 dic.
inicio de obra

22 dic.
platea y platinas

15 ene.
montaje de la estructura

14 abr.
entrega

Días hábiles reales, sin feriados ni licencias de la construcción (23/12 al 9/1 y 22 al 27/3). Incluye 10 días de margen por lluvia y trámites.

La obra día por día







SMART BUILDING URUGUAY

El suelo decide la etapa 1

El estudio de suelos se hace al día siguiente de firmar. Según lo que diga, cambia cuánto suelo hay que sustituir con tosca. Ya está calculado cada caso:

SI EL ESTUDIO DICE...	TOTAL SIN IVA	PLATEA	ENTREGA
Suelo firme: desmonte 0,20 + tosca 0,30	**USD 412.400**	22 dic.	mié, 14 abr.
Sustitución de 0,60 m con tosca	**USD 424.600** (+ USD 12.200)	13 ene. (después de la licencia)	mar, 20 abr.
Sustitución de 0,80 m con tosca	**USD 430.600** (+ USD 18.200)	14 ene. (después de la licencia)	mié, 21 abr.
Sustitución de 1,00 m (como la última obra)	**USD 436.600** (+ USD 24.200)	18 ene. (después de la licencia)	vie, 23 abr.

En todos los casos el movimiento de suelos, las vigas, las previsiones y las platinas se hacen en diciembre. Precio base con suelo firme; si hace falta sustitución, se suma solo esa diferencia.

Pagos por avance

Total obra + proyecto y gestión: **USD 412.400** sin IVA. Cada etapa se paga con un anticipo para acopiar materiales y el saldo contra entrega.

#	HITO	FECHA ESTIMADA	%	MONTO SIN IVA
1	**Firma: proyecto ejecutivo y permiso con inicio anticipado**	18 nov.	5,7 %	USD 23.550
2	**Inicio de obra: anticipo de la etapa 1**	7 dic.	15,7 %	USD 64.555
3	**Platea terminada: saldo de la etapa 1**	22 dic.	8,9 %	USD 36.734
4	**Estructura montada: saldo de estructura + acopio de envolvente**	29 ene.	23,3 %	USD 96.070
5	**Edificio cerrado: saldo de la envolvente**	1 mar.	18,2 %	USD 75.207
6	**Interior terminado**	10 mar.	20 %	USD 82.395
7	**Entrega con habilitaciones**	14 abr.	8,2 %	USD 33.889

Aparte, los aportes de BPS de la obra (≈ USD 28.300) se pagan al costo, mes a mes, según los jornales declarados. Montos sin IVA.

Próximos pasos

18 nov.	19 nov.	~30 nov	7 dic.	22 dic.	14 abr.
Firma	**Estudio de suelos**	**Permiso**	**Obra**	**Platea**	**Entrega**
acuerdo de proyecto y gestión + acuerdo de obra; pago 1	define el escenario de la etapa 1	presentación con inicio anticipado	obrador, suelo y fundación	antes de la licencia	locales listos para alquilar

Condiciones

- Precio sobre el anteproyecto del 17 nov.; los cambios posteriores se cotizan aparte.
- El proyecto y la gestión quedan firmes con la firma; la obra arranca con el inicio anticipado aprobado.
- Precio sin IVA, en dólares; aportes de BPS al costo. Validez de la propuesta: 15 días.
- La misma obra se puede repetir en los padrones 10597 y 10598 con precio por volumen.
