Paneles sándwich y accesorios · pedido de cotización

Edificio de locales de una planta, 25,00 × 10,00 m, estructura metálica con correas C200 cada 2,00 m y largueros C160/C120. Todo el cerramiento en paneles Kingspan Bromyros. Se pide cotización de paneles cortados a medida, accesorios y fijaciones, puestos en obra.

1 · Paneles

USO	PRODUCTO	COLORES	M²
Techo	**Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito**	exterior gris grafito · interior blanco	275,9
Muros	**Isopanel EPS 100 mm, blanco**	blanco / interior blanco	334,1

Ancho útil tomado: techo 1,00 m; muro 1,10 m (confirmar según el producto). Largos a medida según la planilla. Con film protector.


2 · Alternativas a cotizar aparte

- Techo en **Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal, grafito** (pendiente 7 %) en lugar del engrafado.
- Techo en **Isodec EPS 100 mm** (más económico).
- Muros en **panel liso PIR 80 mm (Isowall o similar), grafito**, por comportamiento al fuego.
- Núcleo EPS con retardante de llama y certificado para la habilitación de Bomberos.

3 · Lo que se pide además

- Asistencia técnica de montaje y detalles de remates de Kingspan Bromyros.
- Fichas técnicas y certificado de comportamiento al fuego de cada producto.
- Plazo de fabricación y si entregan por etapas (techo primero, muros después).

4 · Croquis de despiece

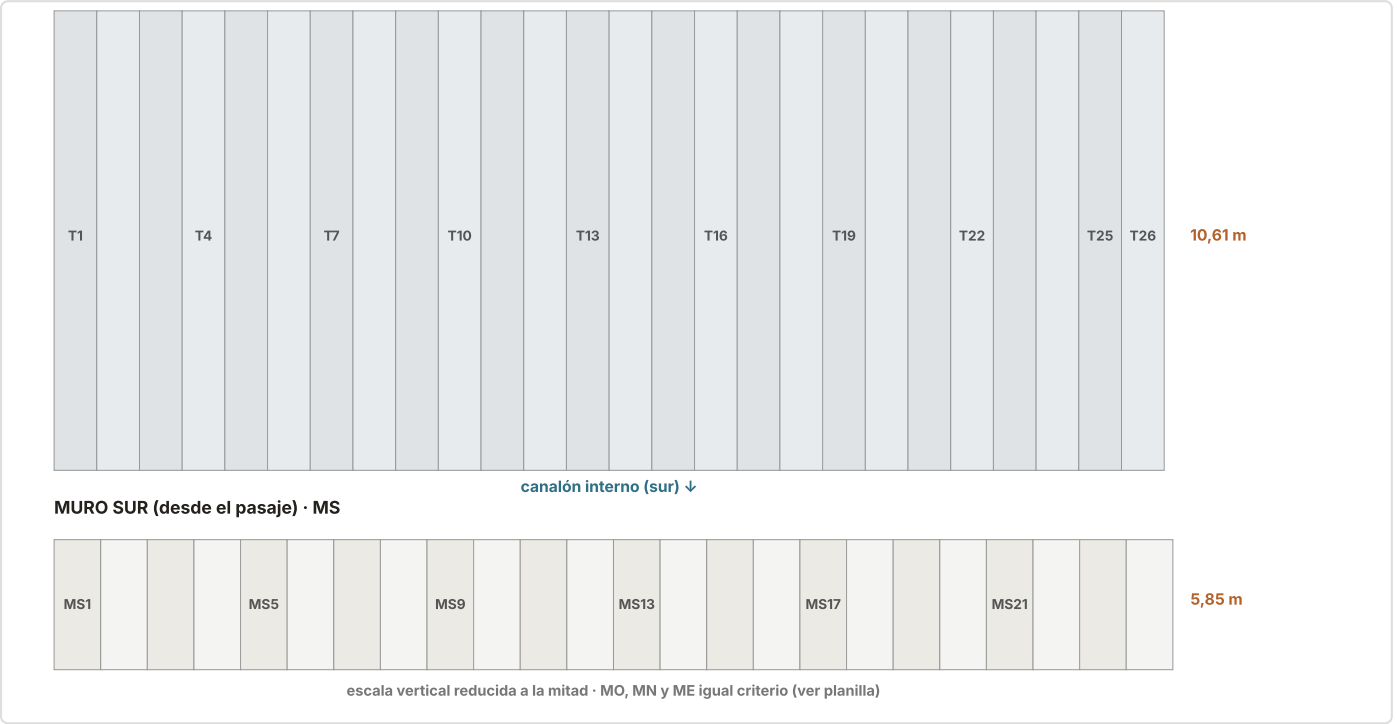

5 · Planilla de paneles (marcas del croquis)

MARCA	DÓNDE	PRODUCTO	CANT.	LARGO M	ANCHO ÚTIL	M²
T1–T26	Techo, paneles de sur a norte (en el sentido de la pendiente) pendiente 3 %, sin empalmes	Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito	26	10,61	1,00	275,9
MS1–MS24	Muro sur, verticales de platea a +6,00	Isopanel EPS 100 mm, blanco	24	5,85	1,10	154,4
MO1–MO10	Muro oeste, verticales	Isopanel EPS 100 mm, blanco	10	5,85	1,10	64,4
MN1–MN23	Franja alta norte (de +3,00 a +6,00, detrás del brise y la cenefa)	Isopanel EPS 100 mm, blanco	23	3,00	1,10	75,9
ME1–ME10	Franja alta del frente a la avenida (de +3,00 a +6,00)	Isopanel EPS 100 mm, blanco	10	3,00	1,10	33
ME0	Frente, tramo junto a la esquina sur (de platea a +6,00)	Isopanel EPS 100 mm, blanco	1	5,85	1,10	6,4
Total			**94**			**610**

6 · Accesorios y fijaciones

#	PIEZA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm	ml	26
2	Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm	ml	73
3	Babeta techo contra muro (norte, este y oeste)	ml	47
4	Cierre de cabeza y gotero del panel de techo	ml	26
5	Esquinero exterior de muro	ml	24
6	Esquinero interior	ml	12
7	Perfil U de arranque (zócalo) con sellador	ml	38
8	Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras y puertas de servicio	ml	56
9	Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa	ml	36
10	Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3)	u	515
11	Tornillos de muro con arandela (68 paneles × 2 por larguero)	u	599
12	Remaches y tornillos de costura de remates	u	900
13	Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml)	u	48
14	Cinta butílica (rollo 15 m)	u	12
15	Espuma de cierre / burletes	ml	60

Remates en chapa prepintada del color del panel; los de la fachada norte y del frente quedan detrás de la cenefa negra.

7 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito (techo, a medida)	m²	276		
2	Isopanel EPS 100 mm, blanco (muros, a medida)	m²	334		
3	Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm	ml	26		
4	Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm	ml	73		
5	Babeta techo contra muro (norte, este y oeste)	ml	47		
6	Cierre de cabeza y gotero del panel de techo	ml	26		
7	Esquinero exterior de muro	ml	24		
8	Esquinero interior	ml	12		
9	Perfil U de arranque (zócalo) con sellador	ml	38		
10	Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras y puertas de servicio	ml	56		
11	Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa	ml	36		
12	Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3)	u	515		
13	Tornillos de muro con arandela (68 paneles × 2 por larguero)	u	599		
14	Remaches y tornillos de costura de remates	u	900		
15	Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml)	u	48		
16	Cinta butílica (rollo 15 m)	u	12		
17	Espuma de cierre / burletes	ml	60		
18	Alternativa: Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal grafito (techo)	m²	276		
19	Alternativa: panel liso PIR 80 mm grafito (muros)	m²	334		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Precio por m² según largo (si cambia)
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.
